

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Acta de Constitución del Proyecto

DDeLi

Fecha: 18 de mayo de 2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

TABLA DE CONTENIDO

Información del Proyecto	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Descripción del Proyecto y Entregables	4
EDT/WBS	6
Requerimientos de alto nivel	6
Objetivos	9
Supuestos y Restricciones	10
Riesgos iniciales de alto nivel	11
Tabla de Gantt	13
Cronograma de hitos principales	13
Presupuesto estimado	14
Lista de Interesados (stakeholders)	16
Requisitos de aprobación del proyecto	16
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	18
Equipo del Proyecto	20
Aprobaciones	21

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Sin Queso Inc.
Proyecto	Plataforma Digital de Postres Artesanales y Personalizados (DDeLi)
Fecha	16 de mayo 2026

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito de DDeLi es desarrollar una plataforma digital orientada a la venta de postres artesanales y personalizados, permitiendo a los clientes consultar un catálogo variado de productos, realizar pedidos en línea y personalizar sus postres según sus gustos y preferencias. El proyecto busca ofrecer una experiencia moderna, cómoda y accesible, donde los usuarios puedan adquirir productos para diferentes ocasiones especiales como cumpleaños, reuniones, celebraciones o eventos.

Además de la venta de postres tradicionales, el aplicativo permitirá a los clientes suscribirse a cajas mensuales de postres sorpresa y solicitar pedidos especiales para eventos, adaptándose a las necesidades de cada usuario. La plataforma contará con un sistema que facilitará la gestión de clientes, productos, pedidos, pagos, envíos, promociones y suscripciones, permitiendo organizar toda la información del negocio de manera clara, segura y eficiente.

El programa dispondrá de una interfaz visual sencilla e intuitiva para que cualquier usuario pueda navegar fácilmente por las diferentes secciones del aplicativo, consultar productos, personalizar pedidos y realizar compras sin complicaciones,

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

brindando una experiencia agradable tanto para los clientes como para la empresa.

Descripción del Proyecto y Entregables

Con el objetivo de ofrecer un aplicativo práctico y organizado en la venta de postres artesanales, DDeLi presenta una plataforma digital diseñada para la gestión y comercialización de postres personalizados. El sistema permitirá a los clientes consultar un catálogo de productos, realizar pedidos en línea, personalizar postres mediante la selección de sabores, toppings y tamaños, además de suscribirse a planes mensuales de postres sorpresa y solicitar pedidos especiales para eventos como cumpleaños, reuniones y celebraciones.

La plataforma contará con un sistema de registro e inicio de sesión que permitirá almacenar información de clientes, historial de pedidos, direcciones de entrega y preferencias personalizadas, brindando una experiencia más cómoda y adaptada a cada usuario. Además, el aplicativo integrará funcionalidades para la gestión de productos, pagos, promociones, envíos y suscripciones, facilitando el control y la administración de la información del negocio.

Como parte fundamental del proyecto, se desarrollará una base de datos relacional que permitirá organizar y relacionar de manera eficiente toda la información del sistema, incluyendo clientes, productos, pedidos, pagos, personalizaciones y entregas. Esto permitirá reducir errores y mejorar el manejo de la información dentro de la empresa.

El aplicativo dispondrá de una interfaz visual sencilla, intuitiva y fácil de usar, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar por las diferentes secciones de la plataforma sin complicaciones. En conjunto, DDeLi busca ofrecer una experiencia completa, organizada y confiable tanto para los clientes como para la gestión interna de la empresa.


Los entregables de este proyecto son los siguientes:

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

1. **Acta de Constitución:** Documento formal que describe los objetivos, alcance, propósito y organización general del proyecto.
2. **Identificación de Interesados (Stakeholders):** Documento que identifica las personas o grupos involucrados en el proyecto y el nivel de participación de cada uno.
3. **EDT/WBS:** Estructura de descomposición del trabajo que organiza las actividades y tareas necesarias para el desarrollo del proyecto.
4. **Cronograma:** Planificación de actividades y tiempos estimados para el desarrollo de cada fase del proyecto.
5. **Presupuesto:** Documento que presenta la estimación de costos y recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta.
6. **Acta de Cierre:** Documento final que evidencia la culminación del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados.
7. **Modelo Entidad-Relación:** Diagramas que representan la estructura y relaciones de la base de datos del sistema.
8. **Diccionario de Datos:** Documento que describe las entidades, atributos y tipos de datos utilizados dentro de la base de datos.
9. **Scripts y Aplicación Web:** Implementación básica de la base de datos y conexión con una aplicación web funcional para la consulta de información.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

EDT/WBS

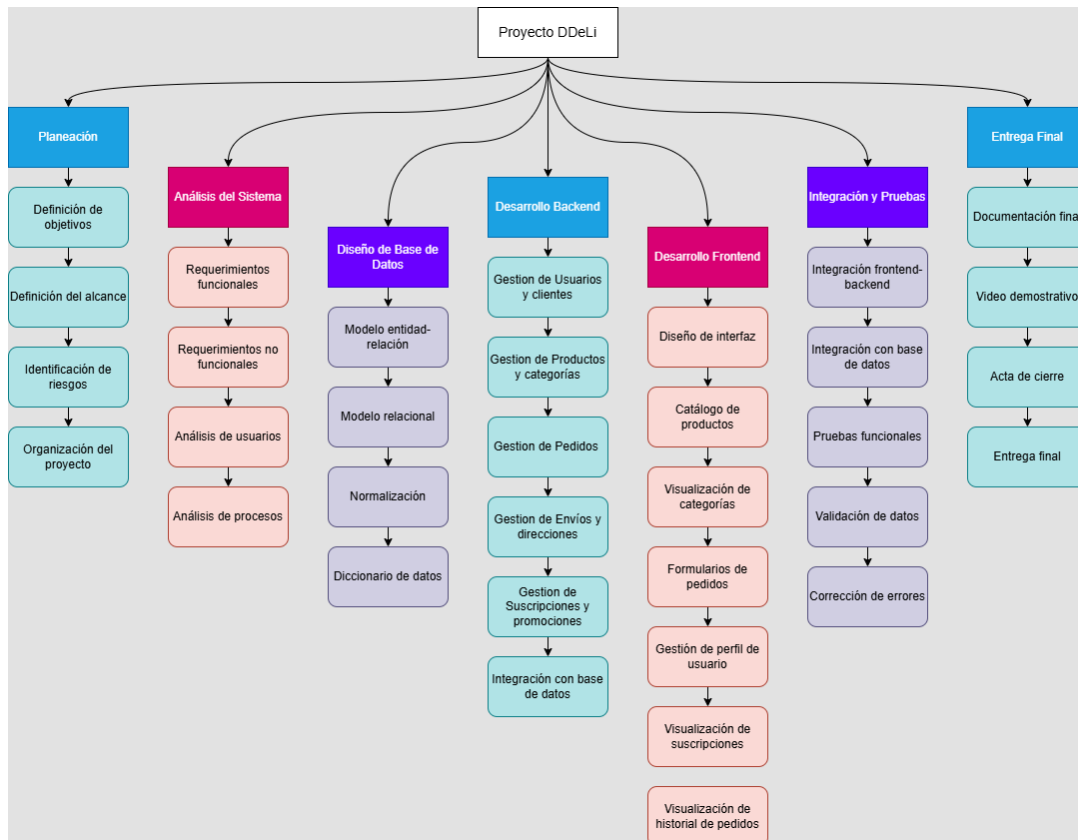

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

1. Registro e Inicio de Sesión de Usuarios

El sistema debe permitir que los clientes se registren e inicien sesión mediante credenciales personales, garantizando la seguridad de la información y el acceso individual a las funciones de la plataforma.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

2. Gestión de Perfiles de Usuario

Cada cliente debe contar con un perfil personal desde el cual pueda consultar su información básica, direcciones de entrega, historial de pedidos y preferencias de personalización.

3. Consulta y Gestión de Productos

El aplicativo debe permitir visualizar el catálogo de postres disponibles, incluyendo información como nombre, descripción, categoría, precio y disponibilidad de cada producto.

4. Personalización de Postres

El sistema debe permitir a los clientes personalizar sus pedidos mediante la selección de sabores, toppings, tamaños y otras opciones disponibles para cada producto.

5. Registro y Gestión de Pedidos

La plataforma debe permitir a los usuarios realizar pedidos en línea, incluyendo uno o varios productos personalizados, almacenando toda la información relacionada con cada compra.

6. Almacenamiento de Información en la Base de Datos

Toda la información relacionada con clientes, productos, pedidos, pagos, personalizaciones, envíos y suscripciones debe almacenarse de manera organizada y segura en una base de datos relacional.

7. Gestión de Pagos y Envíos

El sistema debe permitir registrar pagos y gestionar el proceso de entrega de los pedidos, incluyendo dirección de envío y estado de la entrega.

8. Gestión de Suscripciones y Promociones

La plataforma debe permitir a los clientes suscribirse a planes mensuales de postres y acceder a promociones o descuentos disponibles dentro del sistema.

9. Interfaz de Usuario Intuitiva y Atractiva

El aplicativo debe contar con una interfaz moderna, visualmente agradable y fácil de navegar, permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a las diferentes funciones de la plataforma.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Requerimientos del proyecto

1. Presentación y Organización del Material

Todos los documentos, diagramas, scripts, imágenes y archivos relacionados con el proyecto deben mantenerse organizados en carpetas correctamente clasificadas y con nombres claros, facilitando su revisión y comprensión.

2. Buena Redacción y Documentación Técnica

Toda la documentación del proyecto debe contar con buena ortografía, redacción clara y lenguaje técnico comprensible, permitiendo explicar adecuadamente el funcionamiento de la plataforma y la estructura de la base de datos.

3. Repositorio en GitHub

El proyecto debe contar con un repositorio en GitHub donde se almacenen la documentación, scripts, diagramas y avances relacionados con el desarrollo del sistema, evidenciando el trabajo colaborativo del equipo.

4. Diseño e Implementación de la Base de Datos

El sistema debe incluir una base de datos relacional correctamente diseñada y normalizada, capaz de almacenar y gestionar la información de clientes, productos, pedidos, pagos, envíos y personalizaciones de manera organizada y segura.

5. Video de Demostración del Aplicativo

Se debe presentar un video demostrativo donde se explique el funcionamiento general del aplicativo, incluyendo la consulta de productos, personalización de postres y gestión de pedidos.

6. Entrega Completa del Proyecto

Todos los entregables del proyecto, incluyendo documentación, diagramas, scripts, aplicación web y recursos adicionales, deben entregarse de manera organizada siguiendo las condiciones establecidas para la entrega final.

7. Diseño Visual y Funcionalidad

La plataforma debe contar con una interfaz visual funcional, moderna y fácil de usar, garantizando una experiencia de navegación clara, intuitiva y agradable para los usuarios.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Objetivos

Objetivo	Indicador de Éxito
Alcance	
Desarrollar la plataforma digital de DDeLi, garantizando el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema, como registro de usuarios, consulta de productos, personalización de postres, gestión de pedidos y almacenamiento de información en la base de datos.	Se medirá mediante el porcentaje de funcionalidades implementadas respecto a las planificadas. El proyecto se considerará exitoso cuando todas las funciones principales operen correctamente y sin errores al momento de la entrega final.
Cronograma (Tiempo)	
Cumplir con el desarrollo del proyecto y realizar la entrega final dentro de las fechas establecidas, completando las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación según el cronograma definido.	Se evaluará comparando las fechas reales de avance y entrega con el cronograma establecido. El proyecto será exitoso si todas las fases son completadas dentro del tiempo planeado.
Costo	
Mantener el desarrollo del proyecto dentro de un presupuesto estimado de \$52.920.000 COP, correspondiente al desarrollo de la plataforma durante catorce semanas. Este monto incluye honorarios del equipo de trabajo, gastos operativos y costos asociados al desarrollo del código, implementación de la base de datos y recursos digitales utilizados en el proyecto.	El indicador de éxito será el cumplimiento del presupuesto sin exceder el monto asignado. El proyecto se considerará exitoso si concluye dentro del límite establecido, optimizando los recursos técnicos y operativos sin afectar la calidad y funcionalidad del sistema.
Calidad	
Garantizar que la plataforma cumpla con criterios de funcionalidad,	Se evaluará mediante pruebas de funcionamiento, revisión de la base de

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

organización y facilidad de uso, ofreciendo una experiencia intuitiva y un manejo eficiente de la información almacenada en la base de datos.	datos y validación de las funcionalidades implementadas. El proyecto será exitoso si el sistema funciona de manera estable, organizada y fácil de utilizar.
---	---

Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Se espera que todos los integrantes del equipo participen activamente en las diferentes fases del desarrollo de la plataforma DDeLi, comprendiendo tanto el funcionamiento del sistema como la estructura de la base de datos.
- Se asume que cualquier cambio importante en las funcionalidades, estructura de la base de datos o diseño de la interfaz será comunicado y aprobado previamente por todos los integrantes del equipo.
- Se da por entendido que el proyecto utilizará Eclipse para el desarrollo del backend, WebStorm para el frontend y VirtualBox para la implementación y gestión de la base de datos.
- Se asume que los usuarios contarán con acceso a un navegador web actualizado y conexión estable a internet para utilizar correctamente la plataforma.
- Se espera que la información relacionada con clientes, productos, pedidos, pagos y personalizaciones se almacene de manera segura dentro de una base de datos relacional.
- Se asume que los integrantes del equipo mantendrán comunicación constante mediante herramientas como WhatsApp o Discord para coordinar tareas, revisiones y avances del proyecto.

Restricciones

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

- El desarrollo del proyecto deberá mantenerse dentro de las herramientas seleccionadas por el equipo, garantizando compatibilidad entre el frontend, backend y la base de datos.
- La base de datos deberá implementarse y ejecutarse dentro de una máquina virtual configurada en VirtualBox para garantizar un entorno de desarrollo estable y controlado.
- El código fuente y los archivos del proyecto deberán mantenerse organizados dentro del repositorio de GitHub establecido para el equipo.
- Cada integrante deberá contar con las configuraciones necesarias para ejecutar el proyecto localmente, incluyendo herramientas de desarrollo, dependencias y acceso a la base de datos.
- El sistema deberá limitarse a las funcionalidades definidas dentro del alcance del proyecto, evitando implementar características adicionales que puedan afectar el tiempo de desarrollo o la estabilidad del sistema.
- El proyecto deberá cumplir con principios básicos de seguridad y protección de datos, evitando la exposición de información sensible de los usuarios o credenciales del sistema.
- Los tiempos establecidos dentro del cronograma deberán respetarse; cualquier modificación importante deberá ser acordada entre todos los integrantes del equipo.
- La plataforma será desarrollada como una propuesta académica, por lo que no incluirá integraciones avanzadas como pasarelas de pago reales o despliegue en un entorno productivo.

Riesgos iniciales de alto nivel

1. Falta de comunicación y coordinación entre los integrantes:

Si no se mantiene una comunicación constante entre los encargados del frontend, backend, base de datos y documentación, pueden presentarse errores de integración, retrasos o duplicación de tareas durante el desarrollo del proyecto.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

2. Sobrecarga de trabajo en algunos miembros del equipo:

Existe el riesgo de que algunos integrantes asuman más responsabilidades que otros en el desarrollo de la aplicación o la documentación, generando cansancio y posibles retrasos en las entregas.

3. Fallas en los equipos o problemas de conexión a internet:

Los inconvenientes técnicos, como fallas en computadores, problemas con VirtualBox o interrupciones en la conexión a internet, podrían afectar el desarrollo, pruebas o acceso al repositorio del proyecto.

4. Errores de integración entre frontend, backend y base de datos:

Si las diferentes partes del sistema se desarrollan sin suficiente coordinación, pueden surgir incompatibilidades entre la interfaz, la lógica del sistema y la base de datos.

5. Pérdida o corrupción de información en la base de datos:

Errores en la configuración de la máquina virtual, fallos del sistema o problemas en la gestión de la base de datos podrían ocasionar pérdida o inconsistencias en la información almacenada.

6. Desviación del cronograma establecido:

Los retrasos en el desarrollo de alguna fase del proyecto pueden afectar las actividades posteriores y comprometer la entrega final dentro de las fechas establecidas.

7. Errores o inconsistencias en la documentación:

Si la documentación no se actualiza de acuerdo con los cambios realizados en el sistema, podrían existir diferencias entre lo desarrollado y lo documentado oficialmente.

8. Falta de pruebas funcionales suficientes:


Si no se realizan pruebas constantes del sistema, podrían pasar desapercibidos errores relacionados con el registro de usuarios, personalización de postres, gestión de pedidos o funcionamiento de la base de datos.

9. Problemas en el repositorio de GitHub:

Errores en el manejo de ramas, conflictos de versiones o eliminación accidental de archivos pueden afectar el trabajo colaborativo y el control de cambios del proyecto.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Tabla de Gantt

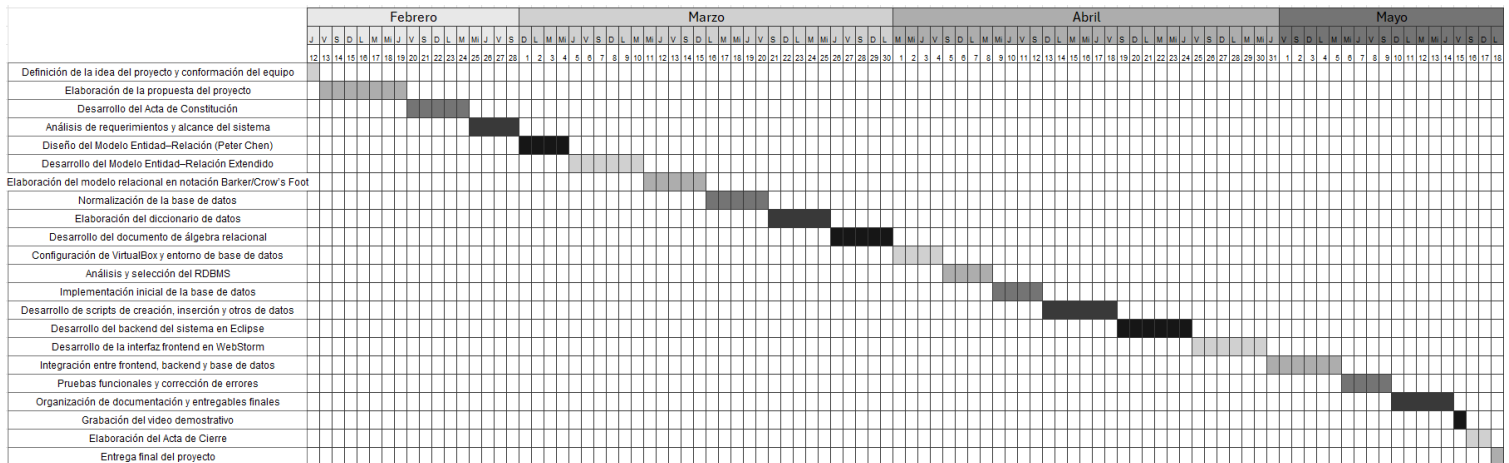

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Definición de la idea del proyecto y conformación del equipo	12 de febrero
Elaboración de la propuesta del proyecto	19 de febrero
Desarrollo del Acta de Constitución	24 de febrero
Análisis de requerimientos y alcance del sistema	28 de febrero
Diseño del Modelo Entidad-Relación (Peter Chen)	5 de marzo
Desarrollo del Modelo Entidad-Relación Extendido	10 de marzo
Elaboración del modelo relacional en notación Barker/Crow's Foot	15 de marzo
Normalización de la base de datos	20 de marzo
Elaboración del diccionario de datos	25 de marzo

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Desarrollo del documento de álgebra relacional	30 de marzo
Configuración de VirtualBox y entorno de base de datos	4 de abril
Análisis y selección del RDBMS	8 de abril
Implementación inicial de la base de datos	12 de abril
Desarrollo de scripts de creación, inserción y otros de datos	18 de abril
Desarrollo del backend del sistema en Eclipse	24 de abril
Desarrollo de la interfaz frontend en WebStorm	30 de abril
Integración entre frontend, backend y base de datos	5 de mayo
Pruebas funcionales y corrección de errores	9 de mayo
Organización de documentación y entregables finales	12 de mayo
Grabación del video demostrativo	15 de mayo
Elaboración del Acta de Cierre	16 de mayo
Entrega final del proyecto	18 de mayo

Presupuesto estimado

Para el desarrollo del proyecto de DDeLi, se ha estimado un presupuesto teniendo en cuenta los diferentes aspectos involucrados en el desarrollo de la plataforma, la implementación de la base de datos y la documentación del sistema.

El equipo de trabajo está compuesto por tres integrantes, donde dos de ellos se encargan del desarrollo Backend, la implementación de la base de datos y la documentación del proyecto, mientras que un integrante se encarga del desarrollo Frontend y la interfaz gráfica del aplicativo.

Los honorarios semanales estimados son los siguientes:

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

- Desarrollador Frontend: \$550.000 COP
- Desarrollador Backend y Documentación: \$650.000 COP
- Desarrollador Backend, Base de Datos y Documentación: \$700.000 COP

Total, en honorarios por semana: \$1.900.000 COP

A esto se suman los costos operativos aproximados por integrante del equipo, calculados de la siguiente forma:

- Alimentación: \$280.000 COP
- Transporte: \$60.000 COP
- Servicios (energía e internet): \$220.000 COP

Total, de gastos operativos por persona por semana: \$560.000 COP

Total, operativo semanal (3 personas): \$1.680.000 COP

Además, se estima un valor adicional correspondiente al desarrollo del código, configuración de la máquina virtual, implementación de la base de datos y recursos digitales utilizados durante el proyecto, equivalente a \$2.800.000 COP en total, distribuidos durante las catorce semanas de desarrollo.

Costo adicional semanal por desarrollo y recursos: \$200.000 COP

Resumen del presupuesto semanal:

- Honorarios: \$1.900.000 COP
- Costos operativos: \$1.680.000 COP
- Desarrollo y recursos digitales: \$200.000 COP

Total, semanal estimado: \$3.780.000 COP

Totales estimados del proyecto (14 semanas):

- Honorarios: \$26.600.000 COP
- Gastos operativos: \$23.520.000 COP
- Desarrollo y recursos digitales: \$2.800.000 COP

Total, general estimado del proyecto: \$52.920.000 COP

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

--

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento/División	Rama ejecutiva/Rol
Ing. Christian Felipe Duarte Arévalo	Cliente	Ingeniería	Interesado
Usuarios	Cliente	Ventas y Pedidos	Consumidores de la Plataforma
DDeLi	Empresa cliente	Ventas y Repostería	Comercio y Servicios
Sin queso Inc.	Creación y desarrollo del aplicativo	Tecnología	Desarrollo y Diseño

Requisitos de aprobación del proyecto

- Acta de Constitución:**
 Documento que presenta la información general del proyecto, incluyendo objetivos, alcance, cronograma, presupuesto, riesgos, stakeholders y demás aspectos administrativos y técnicos relevantes para el desarrollo del sistema.
- Identificación de Stakeholders:**
 Documento donde se identifican las personas, grupos y entidades involucradas en el proyecto, especificando sus roles, responsabilidades e intereses dentro del desarrollo de la plataforma.
- EDT/WBS, Cronograma y Presupuesto:**
 Documentos que describen la estructura de trabajo del proyecto, la planificación de actividades y la estimación de costos necesarios para el desarrollo de la aplicación y la base de datos.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

- **Documento de la Propuesta del Proyecto:**
Documento inicial que describe la problemática, objetivos, alcance, requerimientos funcionales y descripción general del sistema a desarrollar.
- **Documento de Supuestos, Restricciones y Riesgos:**
Documento que establece las condiciones asumidas, limitaciones técnicas y posibles riesgos asociados al desarrollo del proyecto y su implementación.
- **Modelo Entidad–Relación y Modelo Relacional:**
Diagramas elaborados en notación Peter Chen y Crow's Foot/Barker que representen correctamente las entidades, relaciones y estructura lógica de la base de datos del sistema.
- **Diccionario de Datos:**
Documento donde se describen las entidades, atributos, tipos de datos y relaciones utilizadas dentro de la base de datos relacional.
- **Documento de Álgebra Relacional:**
Documento que incluya consultas y ejercicios relacionados con el manejo de la base de datos y las operaciones del álgebra relacional.
- **Documento de Implementación y Configuración:**
Documentación relacionada con la configuración de VirtualBox, implementación del RDBMS y despliegue de la base de datos utilizada en el proyecto.
- **Scripts de Base de Datos:**
El proyecto deberá incluir scripts de creación de tablas, inserción de registros y demás scripts necesarios para la implementación física de la base de datos.
- **Repositorio en GitHub:**

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Todo el desarrollo del proyecto deberá mantenerse organizado dentro de un repositorio de GitHub, incluyendo código fuente, documentación, diagramas y scripts utilizados durante el desarrollo.

- **Conexión entre la Aplicación y la Base de Datos:**
La aplicación web deberá conectarse correctamente con la base de datos relacional, permitiendo registrar, consultar y gestionar la información del sistema.
- **Pruebas Funcionales:**
Se deberán realizar pruebas sobre las funcionalidades principales de la plataforma, incluyendo registro de usuarios, consulta de productos, personalización de postres, gestión de pedidos y almacenamiento de información en la base de datos.
- **Video de Presentación:**
Se deberá entregar un video demostrativo donde participen los integrantes del equipo, explicando el funcionamiento del sistema, la estructura de la base de datos y las funcionalidades principales del aplicativo.
- **Acta de Cierre:**
Documento final donde se evidencie la finalización del proyecto, el cumplimiento de los objetivos y la entrega de todos los componentes establecidos.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento/División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
--------	-------	-----------------------	-------------------------------------

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Deivid Esteban Rodríguez Pinzón	Desarrollador Backend, Base de Datos y Documentación	Desarrollo y coordinación técnica	Dirección de desarrollo
--	---	--------------------------------------	----------------------------

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Deivid Esteban Rodríguez Pinzón tiene la responsabilidad de asignar, redistribuir y supervisar las tareas de los integrantes del equipo según sus habilidades, tiempos y progreso dentro del proyecto. Además, puede reorganizar actividades para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Gestión de presupuesto y control de variaciones	Deivid Esteban Rodríguez Pinzón tiene la autoridad para supervisar el presupuesto estimado del proyecto, controlar los gastos operativos y gestionar el uso de los recursos técnicos utilizados durante el desarrollo de la plataforma y la base de datos.
Decisiones técnicas	Las decisiones relacionadas con el desarrollo del frontend, backend, implementación de la base de datos, estructura del sistema y herramientas utilizadas son discutidas por todo el equipo. Sin embargo, la aprobación final recae en Deivid Esteban Rodríguez Pinzón , quien evaluará la

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

	viabilidad técnica y organizativa del proyecto.
Resolución de conflictos	Ante conflictos relacionados con distribución de tareas, diferencias técnicas o problemas de comunicación, Deivid Esteban Rodríguez Pinzón actuará como mediador entre los integrantes del equipo para buscar soluciones que permitan mantener el correcto desarrollo del proyecto.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	En caso de presentarse problemas técnicos, incumplimiento de actividades o situaciones que no puedan resolverse dentro del equipo, el gerente del proyecto deberá escalar la situación al cliente e interesado principal, Christian Felipe Duarte Arévalo . Además, el gerente no podrá modificar los requerimientos principales, entregables o fechas oficiales sin aprobación previa.

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol Dentro del Proyecto	Departamento/División
Lina Sofia Patiño Calderón	Desarrollador Frontend	Ingeniería
Deivid Esteban Rodríguez Pinzón	Gerente del Proyecto/ Desarrollador Backend/ Base de Datos/ Documentación	Ingeniería

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Gina Daniela Serrato Benavides	Desarrollador Backend/ Base de Datos/ Documentación	Ingeniería
-----------------------------------	---	------------

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
